



«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Директор  
ТОВ «Гідрофлоу Україна»



В.М. Ваврикович  
«25» червня 2021 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Заступник директора з виробництва  
по переробному комплексу  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»



С.В. Канарський  
\_\_\_\_\_ 2021 р.

Начальник ЦВО  
ПрАТ «Полтавський ГЗК»

Пальоха С.С.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»:

Ректор  
ТДАТУ ім. Д.Моторного



В.М.Кюрчев  
«29» червня 2021 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Генеральний директор  
ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»



С.О. Бережецький  
«25» червня 2021 р.

### АКТ ВСТАНОВЛЕННЯ

Приладів HydroFLOW Custom 14” (2 од.), Custom 16” (2 од.) на трубопроводі  
подачі води на систему мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу  
технологічної лінії №1 дільниці обпалення  
цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК»

ПрАТ «Полтавський ГЗК»



за адресою: м. Горішні Плавні Полтавської обл.

вул. Будівельників, 16

2021 р.

Спеціалістами ТОВ «Гідрофлоу Україна» та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» 24.06.2021 р. було встановлено прилади HydroFLOW Custom 14" (2 од.) та прилади HydroFLOW Custom 16" (2 од.) на трубопроводи подачі води на систему мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу технологічної лінії №1 дільниці обпалення цеху з виробництва окатків (ЦВО).

На трубопроводи біля труб Вентурі було встановлено два прилади HydroFLOW Custom 14" серійні номери 17052, 17057.

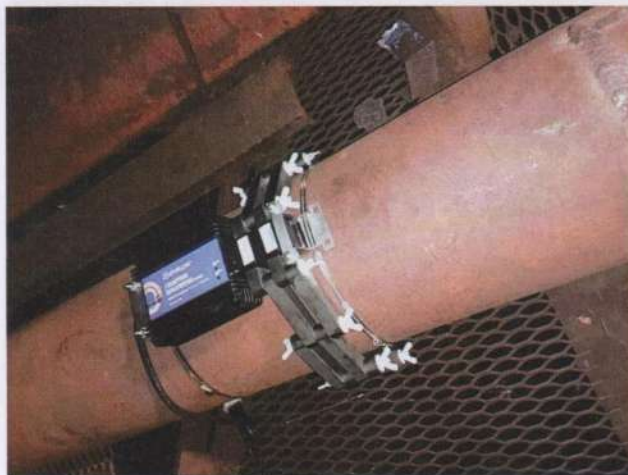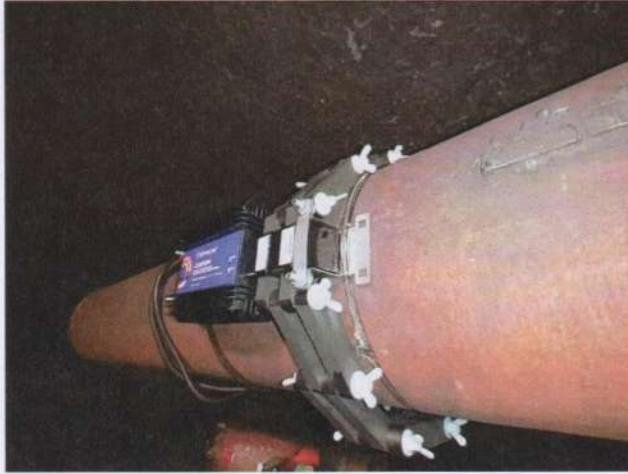


На трубопроводи над ємністю для приготування вапняного молока було встановлено два прилади HydroFLOW Custom 16" (2 од.) серійні номери 17064, 17062






25.06.2021 р. було здійснено підключення до мережі електроживлення, наладка приладу та перевірка наявності необхідного для ефективної роботи приладу сигналу:


- Біля труб Вентурі

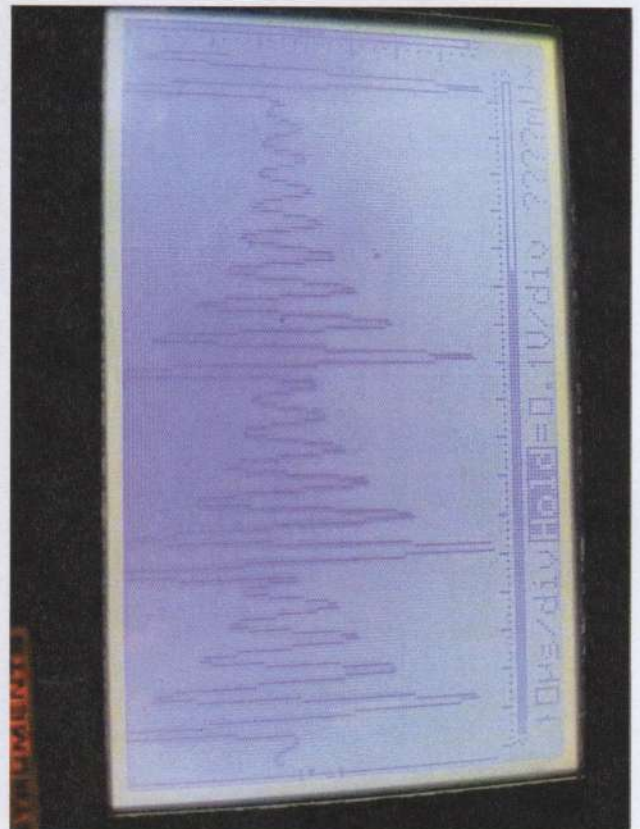

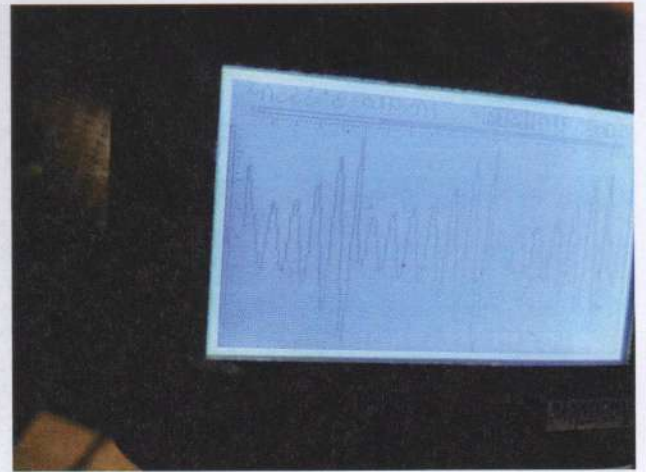

- Над ємністю для приготування вапняного молока



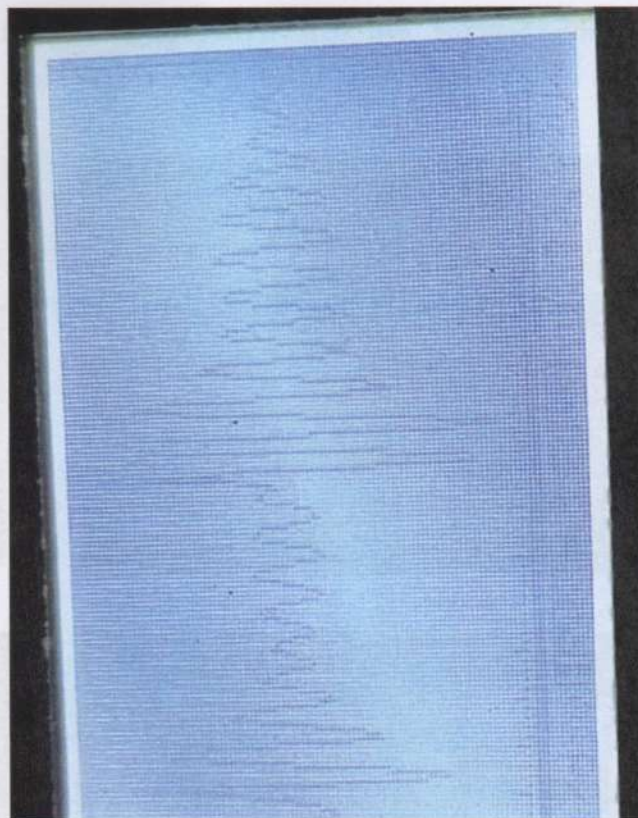

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!**

1. Перед виконанням електрозварювальних робіт на трубопроводах, на яких встановлені прилади, необхідно відключити прилади HydroFLOW від мережі електроживлення.

2. Від відмітки 23,000 м вертикальної ділянки трубопроводу від насосів 21132/21232 до горизонтального колектора вздовж труб «Вентурі» дозволяється проведення електрозварювальних робіт на промисловій площадці при умові забезпечення ізоляції та відсутності контакту промислової площадки з трубопроводом, на якому змонтовані прилади HydroFLOW. Промислова площадка повинна мати контур заземлення.

3. Змонтовані прилади HydroFLOW знаходяться на гарантії протягом 3-х років з дати постачання. В зв'язку з цим будь які операція безпосередньо з приладами HydroFLOW (розбирання, переніс та ін.) можуть здійснюватися тільки спеціалістами ТОВ «Гідрофлоу Україна» або спеціалістами ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ».

4. Враховуючи те, що прилади HydroFLOW знаходяться на гарантії та що протягом року буде проведено контрольний огляд стану трубопроводів на предмет ефективності роботи приладів HydroFLOW, необхідно вести журнал фіксації дат та причин відключення приладів HydroFLOW від мережі електроживлення, та щозміни фіксувати наявність зеленого та червоного сигналу світлодіодних індикаторів, а також фіксувати роботу приладу за допомогою автоматичної системи контролю.


5. При виникненні будь-яких нештатних ситуацій або невідповідність п. 4 та при відключенні приладів на період проведення ППР просимо інформувати електронною поштою ТОВ «Гідрофлоу Україна» - [vavrikovich@h-flow.com.ua](mailto:vavrikovich@h-flow.com.ua) та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» - [bsa@gas.zp.ua](mailto:bsa@gas.zp.ua).

### **РЕКОМЕНДАЦІЯ:**

Враховуючи чутливість приладів HydroFLOW до механічного впливу ТОВ «Гідрофлоу Україна» та ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ» рекомендують виготовити та встановити антивандальний кожух для запобігання будь-яких механічних ушкоджень.


Як приклад надаємо фото антивандальних кожухів:

1. Який використовувався для захисту приладу HydroFLOW, що був встановлений на трубопровід біля підлоги.

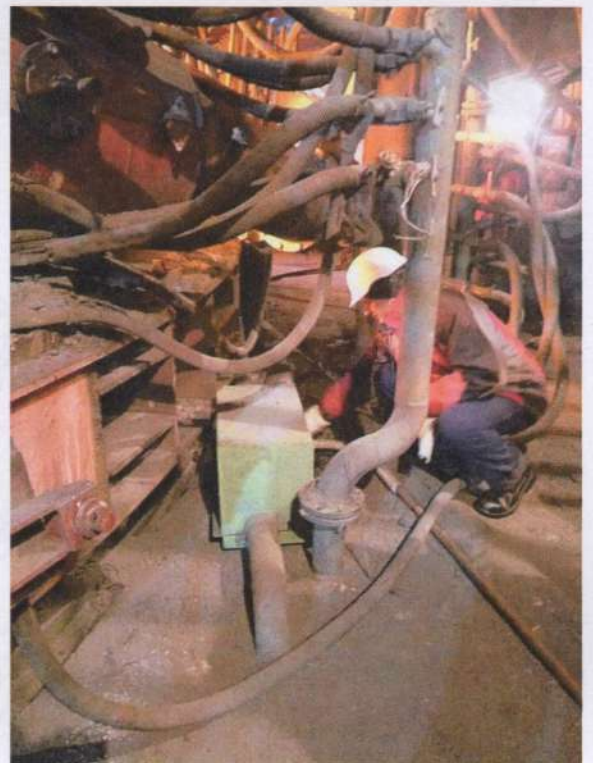

2. Який використовувався для захисту приладу HydroFLOW, що був встановлений на трубопровід, який знаходився у повітрі.



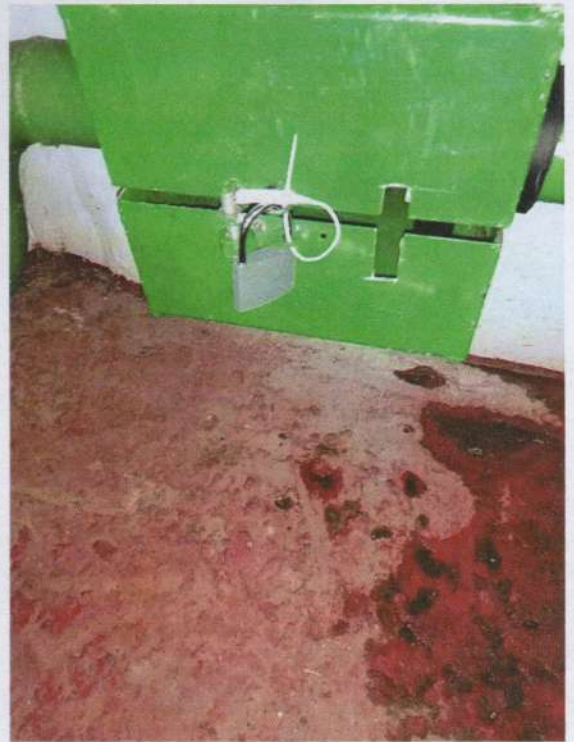

**Від ПрАТ «Полтавський ГЗК»:**

Заступник начальника ЦВО

Начальник дільниці випалу 1

Ст. майстер дільниці випалу 1

Назаренко А.В.

Канарський Д.С.

Репетило А.В.

**Від ТОВ «САВ КОМПЛЕКТ»:**

Фінансовий директор, к.т.н

Бережецький О.В.

**Від ТОВ «Гідрофлоу Україна»:**

Регіональний керівник з продажів,  
Інженер

Стеценко О.В.

**Від ТДАТУ ім. Д.Моторного**

К.т.н.

Мовчан С.І.
